

COMPTE RENDU HEBDOMADAIRE DE CHANTIER DU 23 JUIN 2020

Ordre du jour

COMPTE RENDU HEBDOMADAIRE

Relevé de conclusions


Du mercredi 17 juin 2020

Au mardi 23 juin 2020

1 - Général :

La zone concernée par les travaux est située entre les profils 52 et 73, en phase 6 coté Buech.

Les travaux en phase 1, 2 et 4 (à gauche dans le sens des profils) sont terminés. Pas de terrassements prévus en phase 3 et 5. La circulation s'effectue sous alternat.

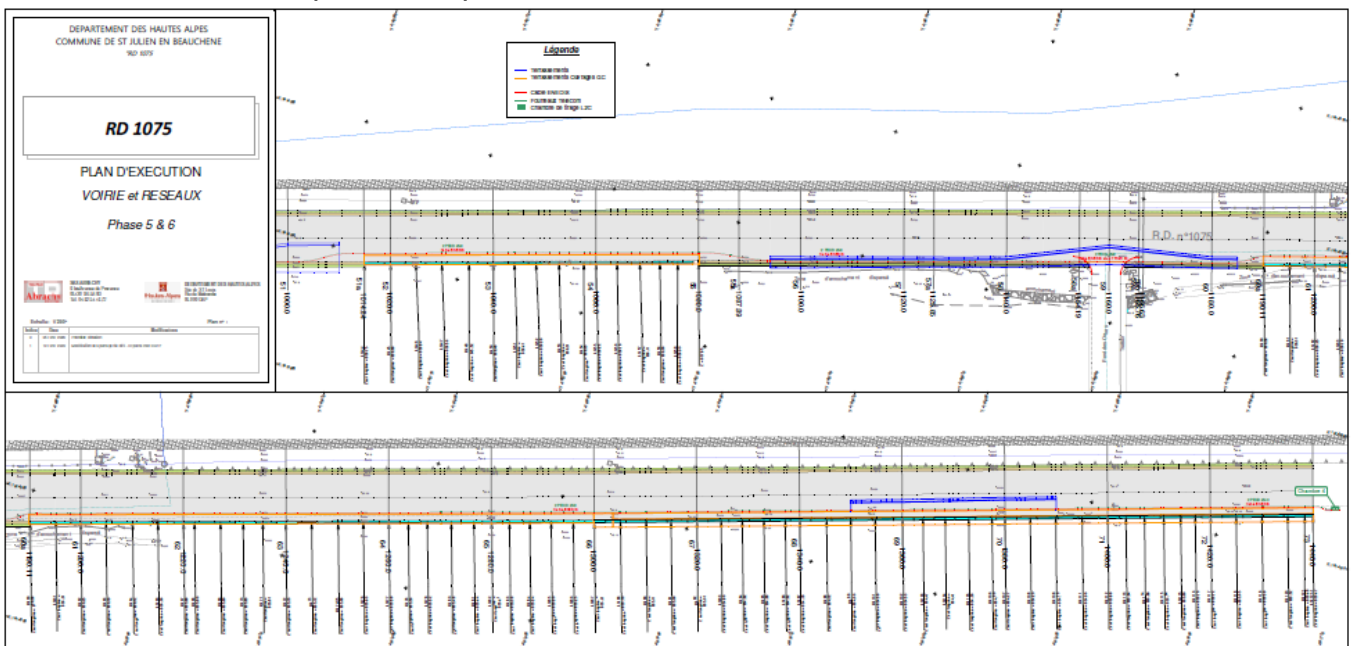

2 - Avancée des travaux :

- L'entreprise Abrachy est en train de terrasser en phase 6. Ils ont commencé par libérer les zones d'intervention de Queyras sur cette zone où il y a beaucoup de travail au niveau des murs. Des enrochements ont été trouvés sous la zone des murs de soutènement, les terrassements s'en retrouvent impactés, un levé topographique est prévu afin d'évaluer le volume de terrassement à ce niveau.
- Un géotextile sera mis en place dans le talus terrassé pour la zone mur de soutènement (P66 à 73) avant remblais. Le remblai à ce niveau sera effectué en 80/150 ainsi qu'à l'arrière des barbacanes.
- L'entreprise Queyras a commencé à couler le béton de propreté et les murs de soutènement prévus entre les profils 66 et 73 sont en cours de réalisation jusqu'à vendredi. Intervention suivante au niveau des longrines.
- Les terrassements entre les deux zones de mur sont terminés. Remblais en cours.
- L'entreprise ETEC est venue réaliser une boîte de jonction en phase 6 cette semaine pour le compte d'Enedis.
- L'entreprise Colas pourra intervenir du mardi 7 juillet au vendredi 10 juillet en phase 6.
- Au niveau de l'entrée et la sortie de la zone neutralisée, il faudra adapter l'implantation de l'enrobé sur environ 40 m de manière à avoir une continuité de circulation fluide.
- Afin de ne pas mettre à l'arrêt le lot 1, ni ne créer de grosses zones de perturbations de circulation, les enrobés du P1 à la zone neutralisée P73 seront programmés avec l'entreprise Colas à partir de septembre en fonction de l'avancement.
- À la suite du rendez-vous avec l'entreprise Aximum de vendredi dernier, nous attendons un devis et un planning d'intervention pour le remplacement des glissières de sécurité en phases 5, 7 et devant le PMV.

3 – Divers :

- Un représentant de l'entreprise ERG, est venu réaliser un contrôle sur le chantier ce lundi, et nous a validé de la nature des terrains d'assise des murs en L.
- Des problèmes au niveau de la fluidité du trafic ont été rencontrés ce weekend en raison de l'alternat mis en place afin de pouvoir réaliser ce chantier. Le système d'alternat en phase 6 fonctionne sur une longueur du chantier de 500m. Le réglage des feux mis en place par l'entreprise par rapport à la

longueur d'emprise des travaux ne permet pas de descendre au niveau de la temporisation.

L'entreprise doit évaluer la possibilité de modifier la carte de programmation en fonction du sens chargé et nous faire un retour.

Cependant dès la prochaine zone de travaux c'est-à-dire à mi-juillet, durant la période estivale les phases travaux seront réduites de 300 m maximum afin de limiter l'impact sur la circulation.

L'idée étant de réaliser en priorité en phase 7 les travaux du mur SNCF à partir du 20/07/20 (**Sous réserve d'autorisation SNCF**). Puis en attendant le retour de congés de COLAS les tranchées de la phase 10 pourraient être traitées en chaussée rétrécie.

Sans autorisation à partir du 20/07/20a SNCF pour ces dates, le planning général serait rallongé de 3 à 4 semaines au global.

- En vue du constat à réaliser à la fin du mois de juin, il est demandé à toutes les entreprises de **transmettre leurs bons** matériaux pour traitement.
- Congés annuels des entreprises pour la période estivale : Colas du 10 au 21 août et Abrachy du 3 au 14 août.

Rappel - Voici les éléments relatifs à ce chantier vus avec la SNCF vendredi 12 juin :

- Pose du filet orange : la pose est nécessaire pour démarquer la zone ferroviaire. Elle peut s'effectuer sans accompagnement de la SNCF sous réserve que l'entreprise réalise la pose depuis la chaussée. (Si la pose / dépose de GS s'effectue pendant le chantier).
- Mur de soutènement : les ressources ont fait l'objet d'une demande de réservation auprès du guichet unique. En l'absence de certitude sur la disponibilité d'une ressource suffisante, il est proposé de réaliser une visite sur site avec le CD05, les entreprises et Jean-Marc GALINIER afin de trouver un autre mode opératoire (Ex : installation/désinstallation d'un mur en planche pour protéger la zone de nuit, puis travaux de jour). La SNCF doit proposer des dates fin juin-début juillet.

La semaine prochaine, la réunion sera tenue sur place le MARDI 30 JUIN 2020 à 15h.

5- Diaporama :



LISTE DES PARTICIPANTS

Participants		Présent	Excusé	Représenté par	Contacts
Prénom NOM	Organisme				
Gilles DELABELLE	SI – CD 05		X		gilles.delabelle@hautes-alpes.fr
Marc MESCLE	ATV – CD 05		X		marc.mescle@hautes-alpes.fr
Aurélie PICOT	SI – CD05		X		aurelie.picot@hautes-alpes.fr 04 86 15 33 01
Johanna BUCCERI	ATV – CD05	X			johanna.bucceri@hautes-alpes.fr 06 89 03 67 95
Laurent BOYER	ATV – CD05	X			laurent.boyer@hautes-alpes.fr 06 07 88 41 15
François PEUZIN	SI -CD05		X		francois.peuzin@hautes-alpes.fr 04 4 86 15 35 78
Thomas BONNET	ABRACHY	X			thomasb.abrachy@gmail.com 06 07 97 82 77
Jérôme GESTIERO	QUEYRAS		X		jerome.gestiero@vinci-construction.fr
Mickaël MASSE	QUEYRAS	X			mickael.masse@vinci-construction.fr 06 33 25 96 82
David ESPERANDIEU	COLAS		X		david.esperandieu@colas-mm.com 04 92 52 26 26
Quentin DURBEC	COLAS	X			quentin.durbec@colas.com 06 69 06 11 00
René SIMON	APAVE		X		rene.simon@apave.com 06 19 96 45 84
Julie MATTEI	SEGED		X		jmattei@ceged-environnement.com 07 71 76 54 23
Nicole FABREGAS	SEGED		X		nfabregas@ceged-environnement.com 06 24 53 57 49
M. VALLIER	MAIRE DE ST-JULIEN-EN-BEAUCHENE		X		stjulien05@orange.fr vallierjean-claude@orange.fr
Stéphane CHARRIER	ENEDIS		X		sylvain.charrier@enedis.fr 06 64 88 91 10
Nicolas BONNOT	ORANGE		X		nicolas.bonnot@orange.com
